

ALLEGATO "A"

Comune di Potenza
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ IN POTENZA

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo - Parrocchia "San Michele Arcangelo".

CANTIERE: Via Pretoria n. 109, Potenza (PZ)

Potenza, 14/06/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Cantisani Francesco)

per presa visione


IL COMMITTENTE

(Responsabile del procedimento Loperte Ing. Gianluca)

Ingegnere Cantisani Francesco


Via Centomani n. 11
85100 Potenza (PZ)
Tel.: 0971 54761 - Fax: 0971 54761
E-Mail: f.cantisani@alice.it


CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

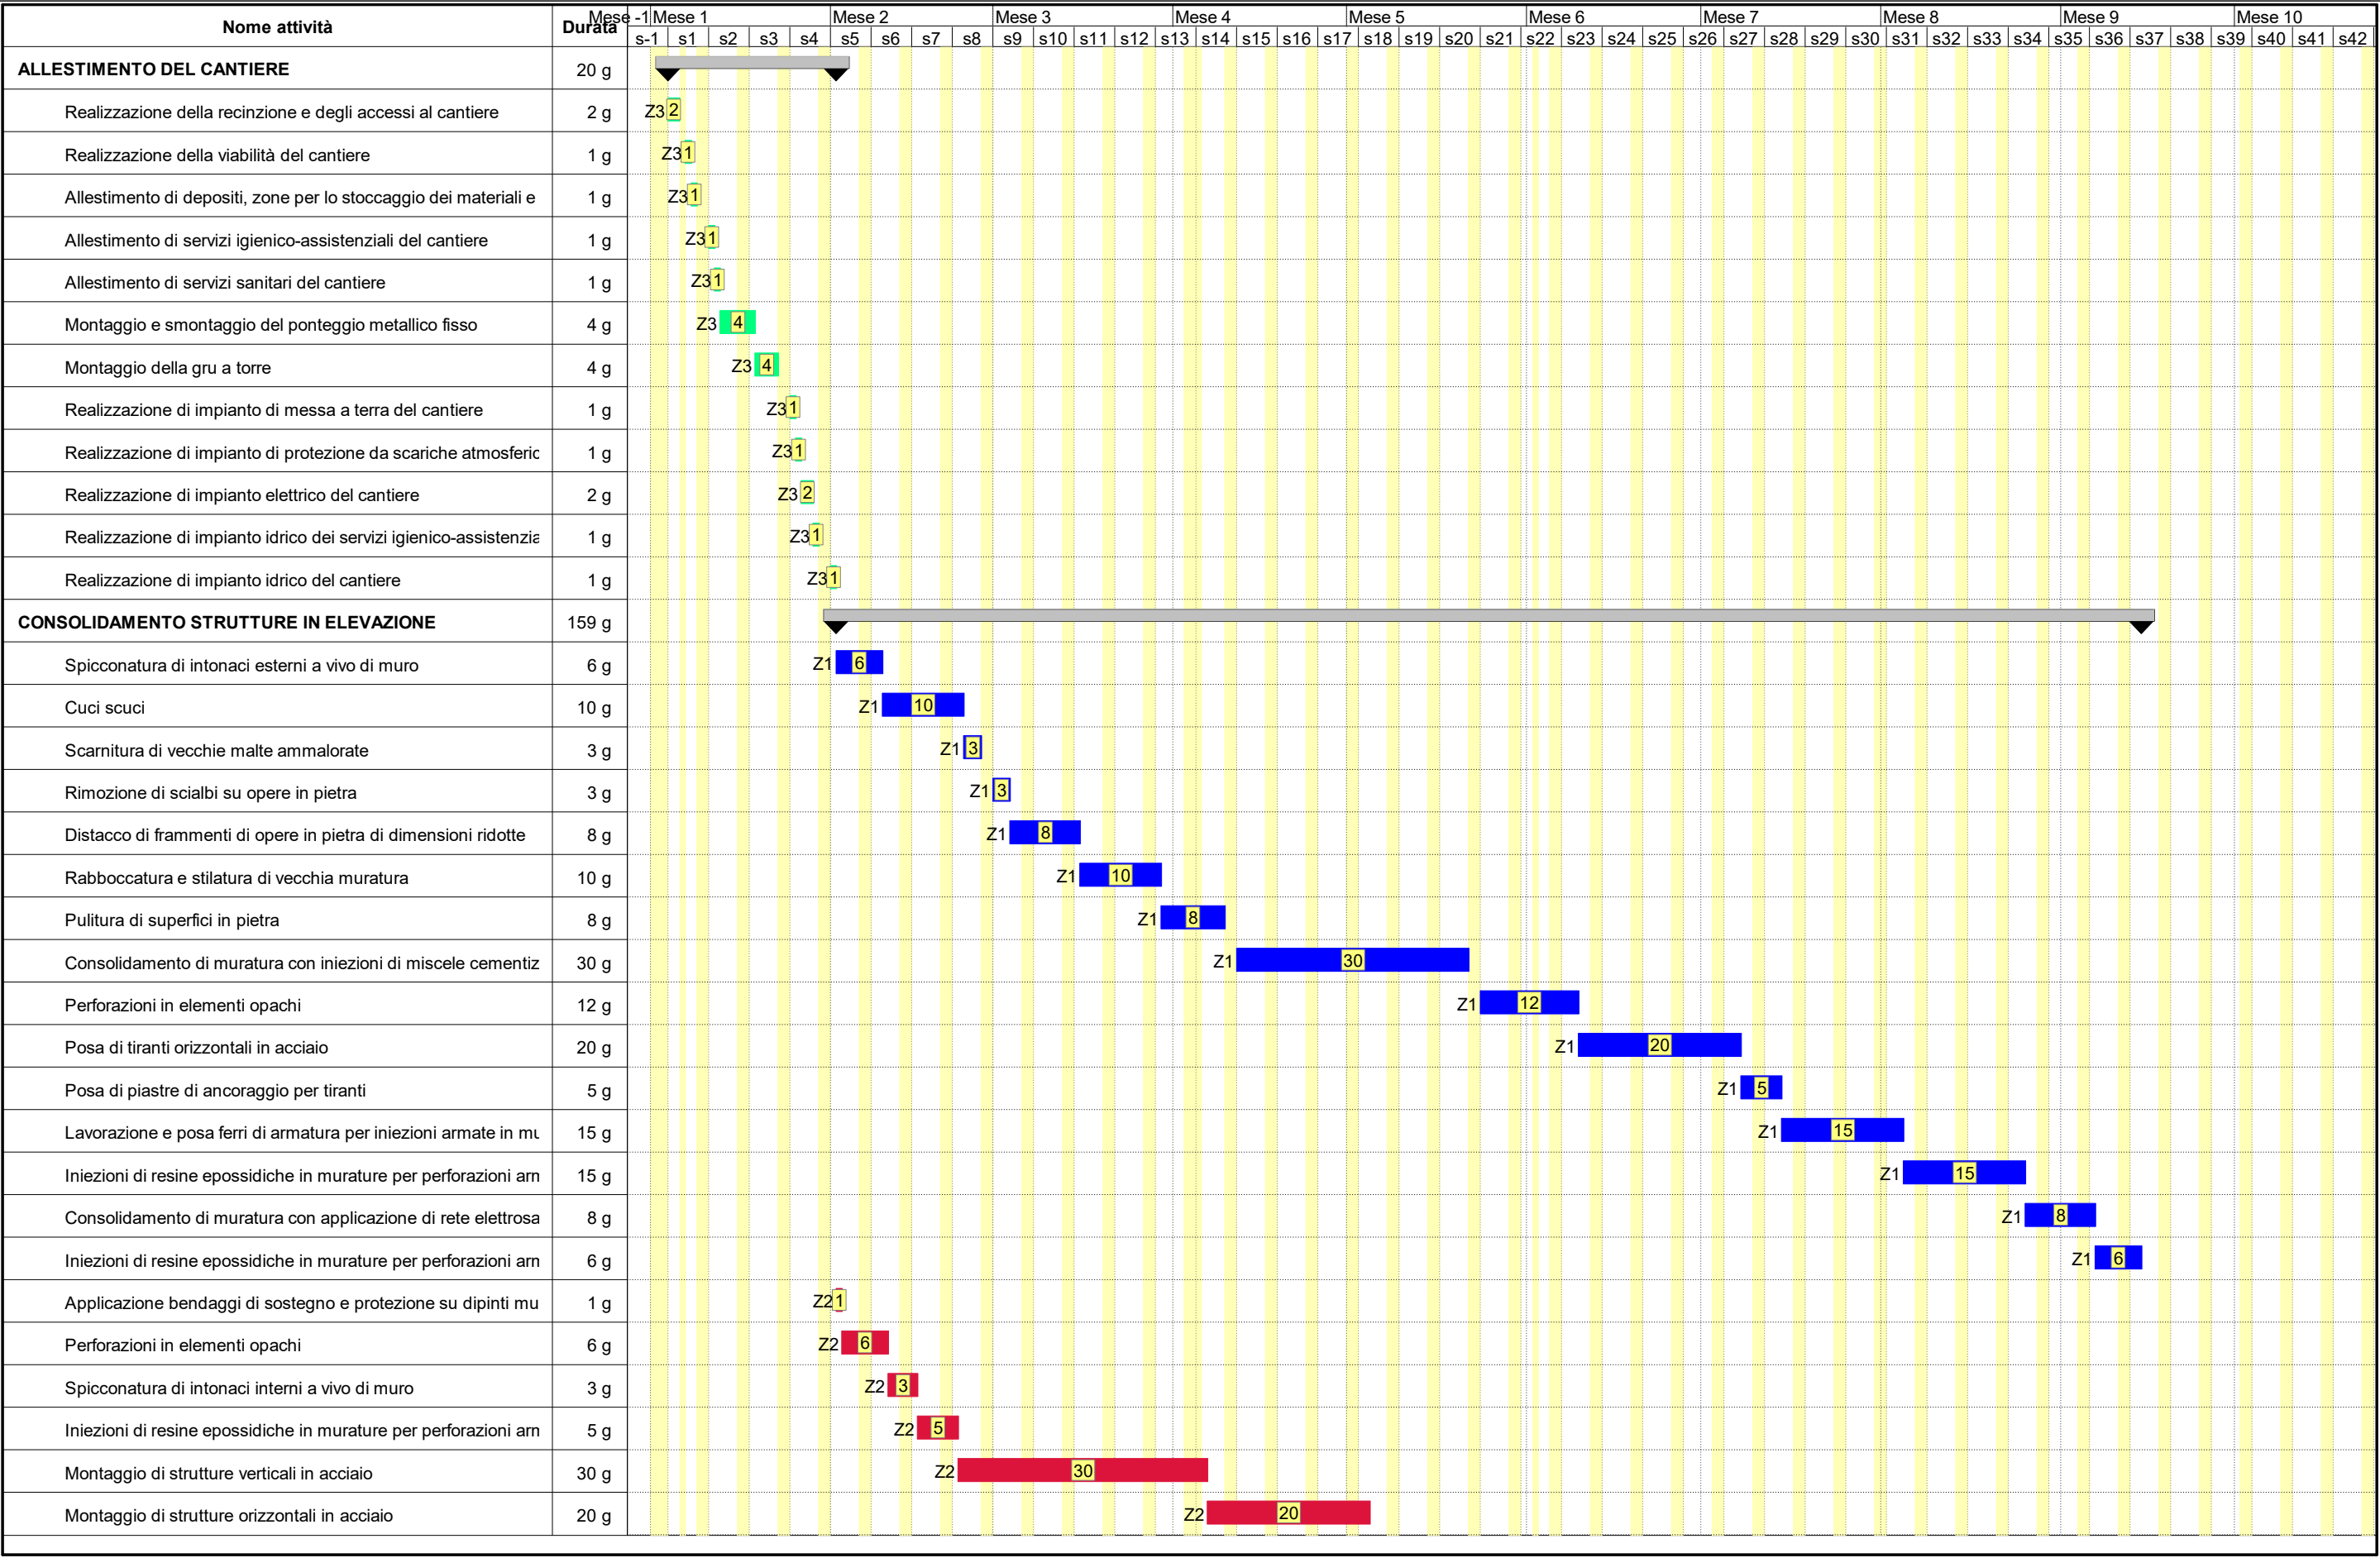

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1					Mese 2					Mese 3					Mese 4					Mese 5					Mese 6					Mese 7					Mese 8					Mese 9					Mese 10				
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42								
Montaggio di scala interna in acciaio	10 g																			Z2	10																															
Consolidamento di muratura con applicazione di rete in carboni	6 g																				Z2	6																														
Perforazioni in elementi opachi	6 g																					Z2	6																													
Iniezioni di resine epossidiche in murature per perforazioni arm	6 g																						Z2	6																												
Realizzazione di murature in elevazione	4 g																							Z2	4																											
Posa di tiranti orizzontali in acciaio	3 g																								Z2	3																										
Posa di tiranti verticali in acciaio	3 g																									Z2	3																									
Perforazioni in elementi opachi	4 g																									Z2	4																									
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in mu	3 g																										Z2	3																								
Iniezioni di resine epossidiche in murature per perforazioni arm	3 g																											Z2	3																							
Cuci scuci	8 g																												Z2	8																						
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura	6 g																													Z2	6																					
Pulitura di superfici in pietra	3 g																														Z2	3																				
CONSOLIDAMENTO STRUTTURE DI FONDAZIONE IN C.A.	57 g																																																			
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	10 g																																																			
Scavo a sezione obbligata	2 g																																																			
Rimozione di pavimento in marmo	4 g																																																			
Rimozione di massetto	3 g																																																			
Perforazioni per micropali	10 g																																																			
Posa ferri di armatura per micropali	2 g																																																			
Getto di calcestruzzo per micropali	1 g																																																			
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	1 g																																																			
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	2 g																																																			
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1 g																																																			
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	4 g																																																			

[illegible]

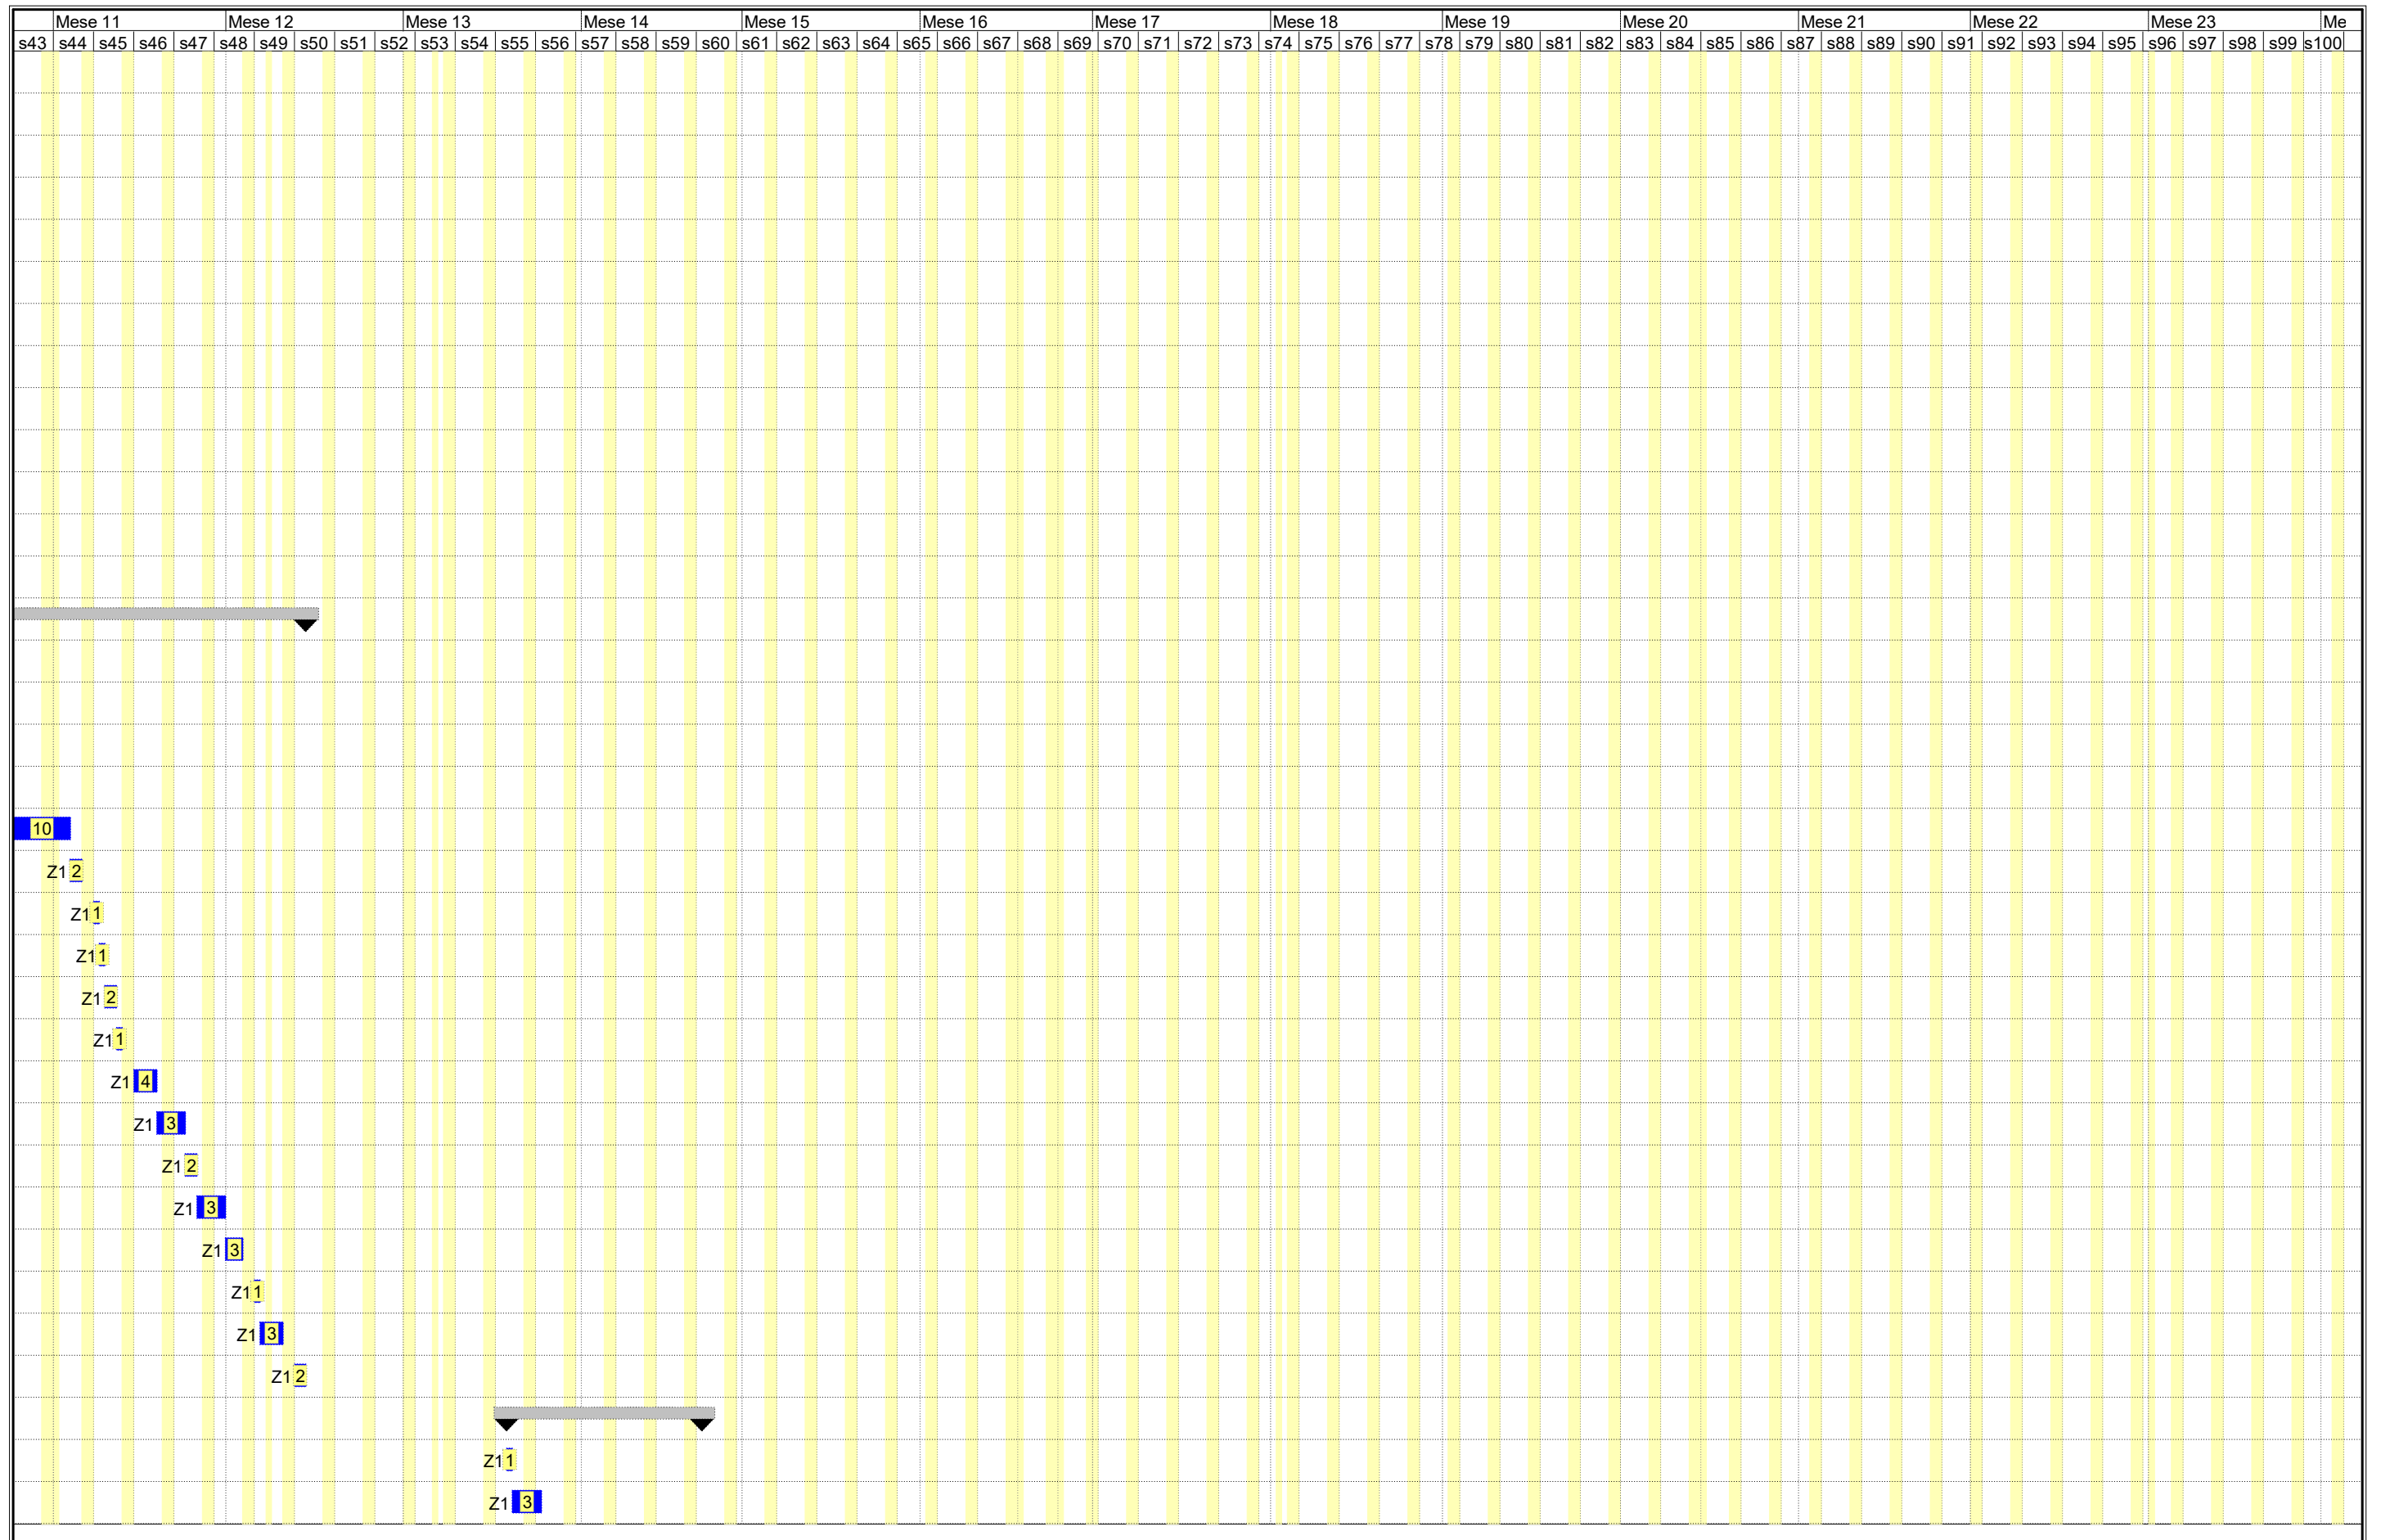

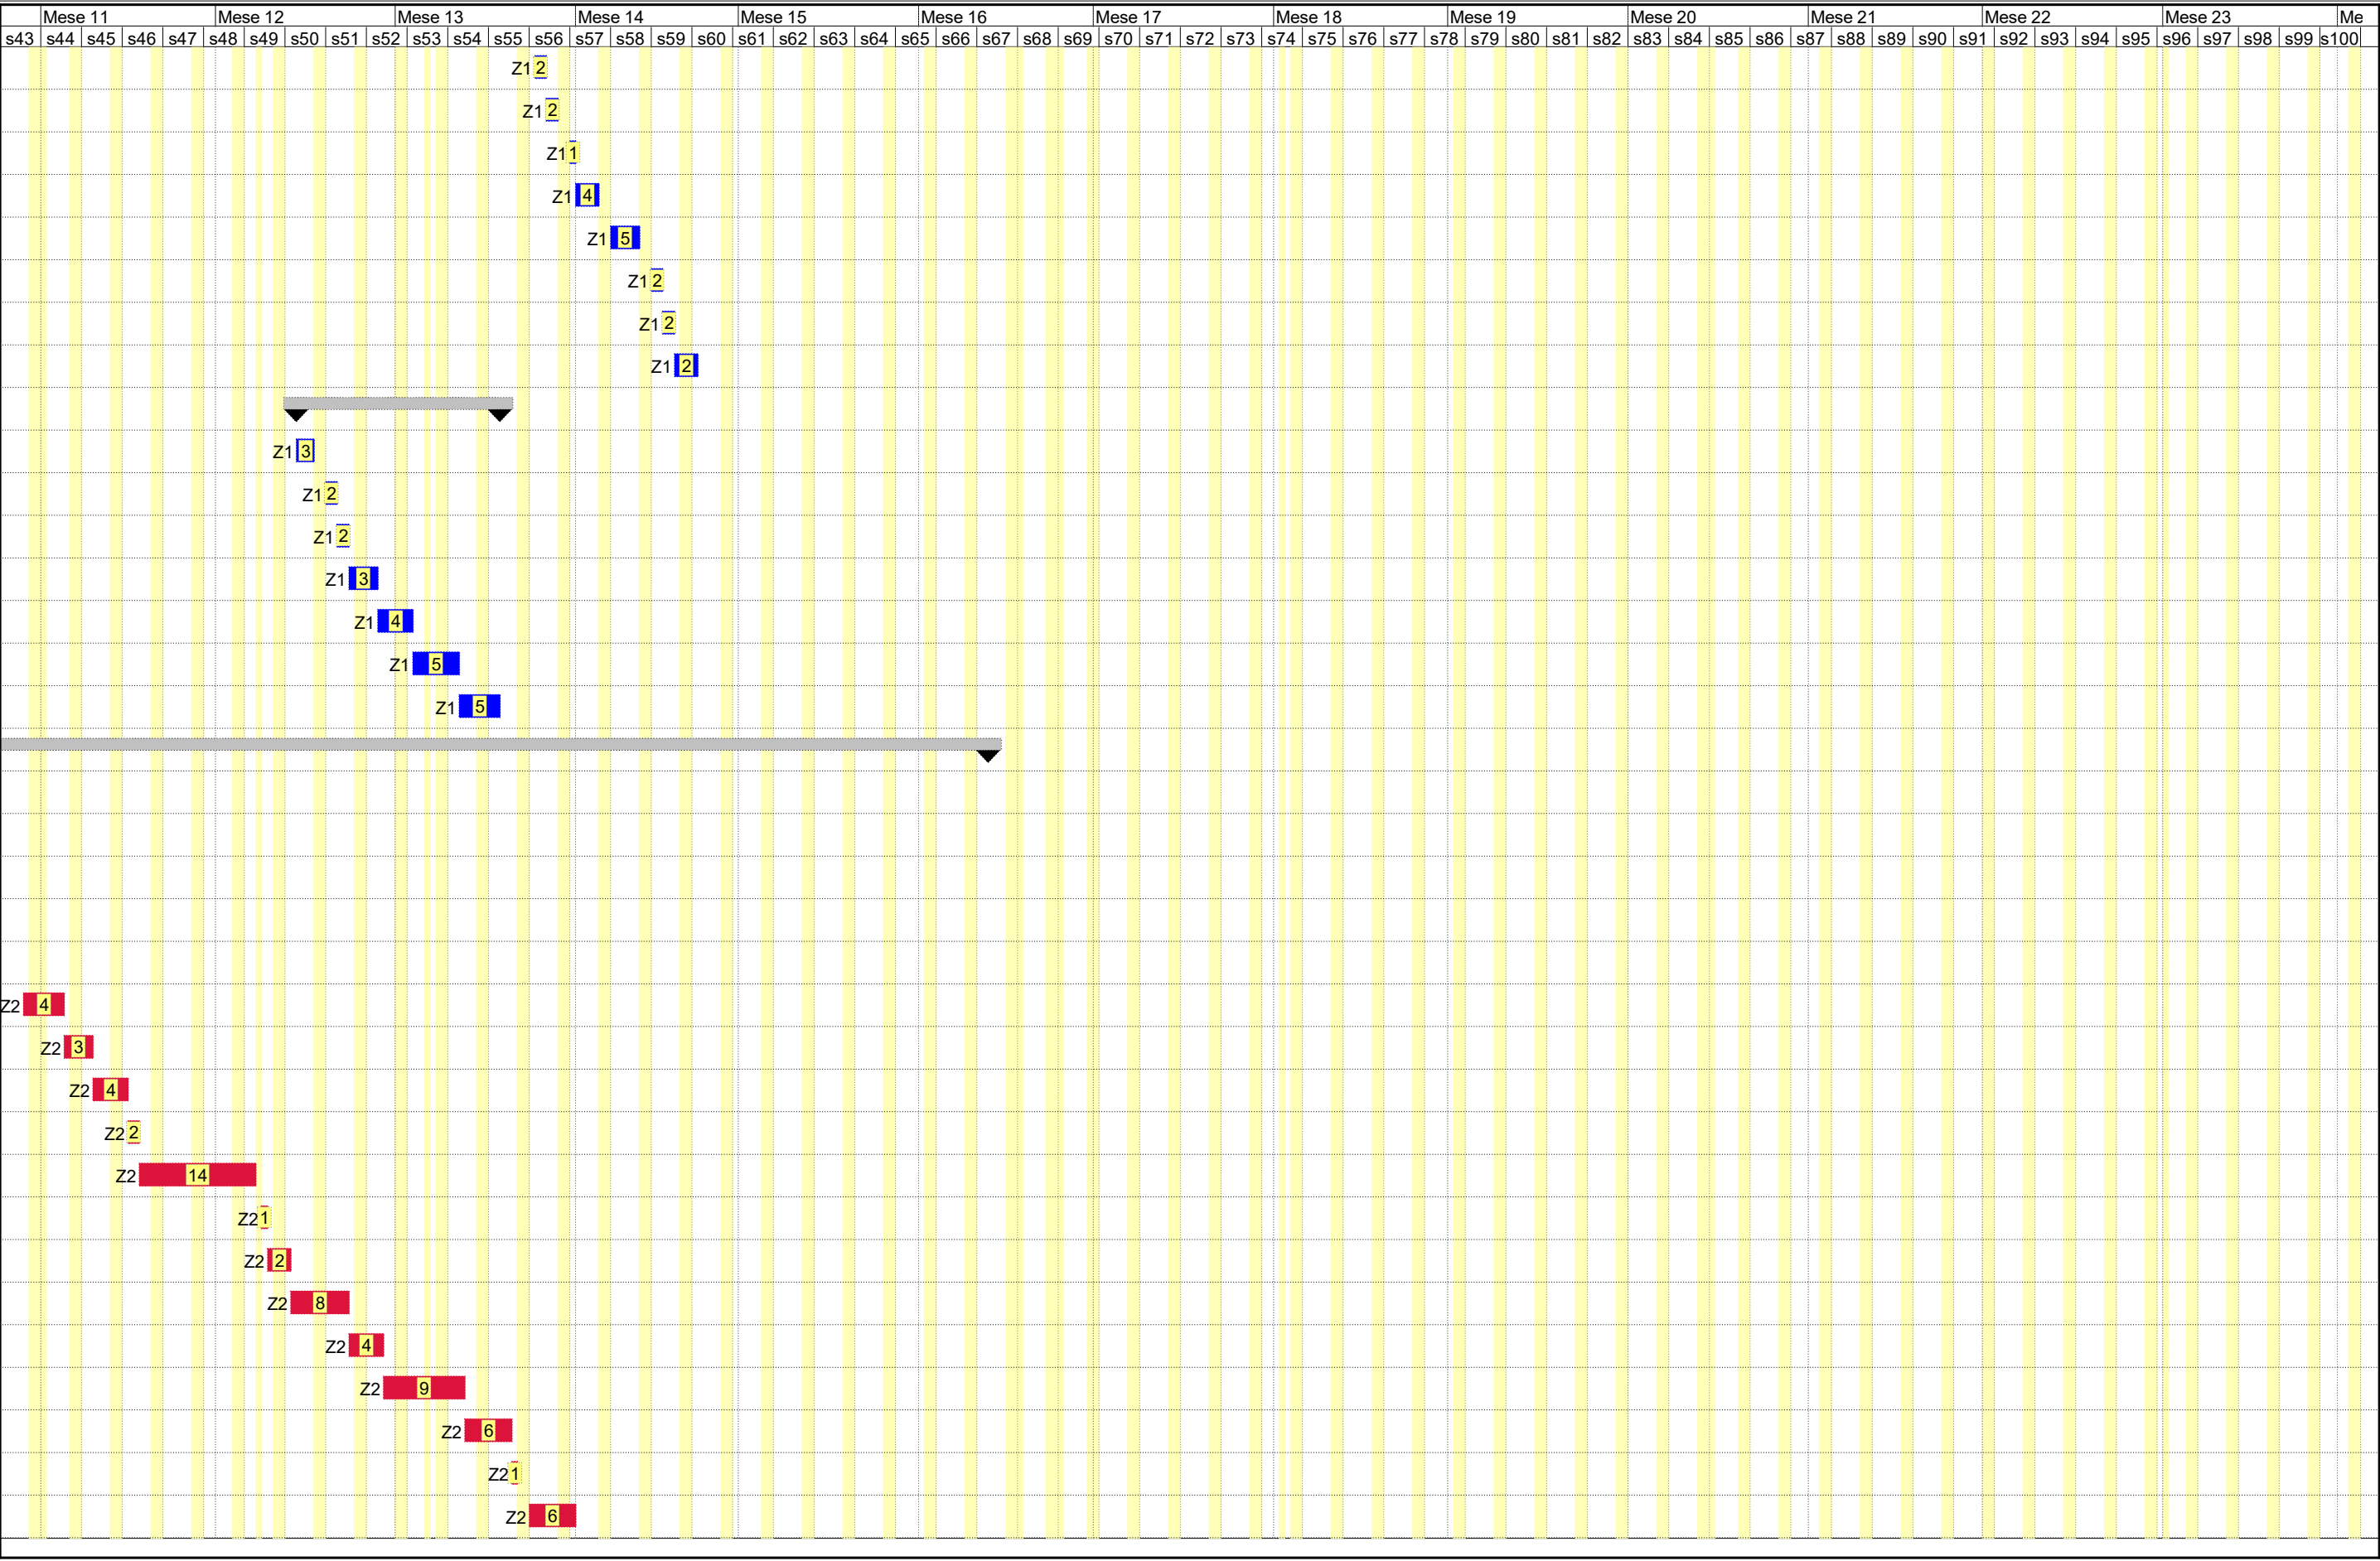

Mese 11					Mese 12					Mese 13					Mese 14					Mese 15					Mese 16					Mese 17					Mese 18					Mese 19					Mese 20					Mese 21					Mese 22					Mese 23					Me	
s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50	s51	s52	s53	s54	s55	s56	s57	s58	s59	s60	s61	s62	s63	s64	s65	s66	s67	s68	s69	s70	s71	s72	s73	s74	s75	s76	s77	s78	s79	s80	s81	s82	s83	s84	s85	s86	s87	s88	s89	s90	s91	s92	s93	s94	s95	s96	s97	s98	s99	s100									
														Z2				14																																																
																Z2				15																																														
																				Z2				15																																										
																									Z2			7																																						
																									Z3	3																																								
																									Z3	3																																								
																									Z3	4																																								
																									Z3	2																																								
