



Programma Operativo Val d'Agri Melandro Sauro Camastra

Soggetto Responsabile Regione Basilicata
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale
Struttura di Progetto Val d'Agri
Piazza Zecchettin - Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ)



Comune di PATERNO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI DI CULTO

1. Chiesa San Bartolomeo - c/da Piazzolla Paterno (PZ)
2. Opere di completamento "Chiesa Madre" - via R. Scotellaro Paterno (PZ)

Soggetto Attuatore
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Comune di Paterno (PZ)

Allegati

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Validazioni


Revisione n.

Del

Scala

Redatto da

Geom. Sangiorgio Giuseppe



Date

Settembre 2023



CRONOPRGRAMMA

redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 100 ed Allegato XV Punto) e s.m.i.

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE: CHIESA SAN BARTOLOMEO

COMMITTENTE: Committente

INDIRIZZO CANTIERE: Contrada Piazzolla 85050 PATÉRNO (PZ)

*il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione*
geometra Sangiorgio Giuseppe

FIRMA

il Committente
Parrocchia San Giovanni Evangelista

FIRMA

il Responsabile dei lavori
Parrocchia San Giovanni Evangelista

FIRMA

Il Direttore dei lavori
Ing. Di Grazia Nicola

FIRMA

*Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione*
Ingrgnere Di Grazia Nicola

FIRMA.....

Versione N° 1 -del 14/04/2025




Sezione 6 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

In osservanza all'allegato XV, punto 2.1.2, lettera i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono state analizzate le attività lavorative previste nel presente piano di sicurezza.

Le durate previste delle lavorazioni e delle singole fasi che costituiscono il Cronoprogramma dei lavori sono riportate nella seguente tabella che sintetizza i dati derivanti dal diagramma di Gantt allegato.

Attività	Durata	Inizio - fine	Importo	% M.O
ALLESTIMENTO CANTIERE	32 g			
Montaggio recinzione e cancello di cantiere	1 g	22/04/2025 - 22/04/2025	0,00 €	35,00
Montaggio baracche	1 g	23/04/2025 - 23/04/2025	0,00 €	35,00
Montaggio bagni chimici	1 g	24/04/2025 - 24/04/2025	0,00 €	35,00
Montaggio box prefabbricati	1 g	28/04/2025 - 28/04/2025	0,00 €	35,00
Viabilità e segnaletica cantiere	1 g	29/04/2025 - 29/04/2025	0,00 €	35,00
Allestimento di depositi	6 g	30/04/2025 - 05/05/2025	0,00 €	35,00
Apposizione segnaletica cantiere	1 g	06/05/2025 - 06/05/2025	0,00 €	35,00
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere	1 g	07/05/2025 - 07/05/2025	0,00 €	35,00
Montaggio ponteggio	9 g	08/05/2025 - 16/05/2025	0,00 €	35,00
Montaggio linea di ancoraggio	2 g	19/05/2025 - 20/05/2025	0,00 €	35,00
Protezione botole ed asole	3 g	21/05/2025 - 23/05/2025	0,00 €	35,00
OPERAZIONI DI SCAVO	9 g			
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m	5 g	26/05/2025 - 30/05/2025	0,00 €	35,00
Trasporto a rifiuto	1 g	03/06/2025 - 03/06/2025	0,00 €	35,00
DEMOLIZIONE, SCAVI E FONDAZIONI	27 g			
Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera	9 g	04/06/2025 - 12/06/2025	0,00 €	35,00
Getto per pareti in c.a.	4 g	13/06/2025 - 16/06/2025	0,00 €	35,00
Vibrazione calcestruzzo	4 g	13/06/2025 - 16/06/2025	0,00 €	35,00
Disarmo strutture c.a.	4 g	17/06/2025 - 20/06/2025	0,00 €	35,00
Trasporto a rifiuto	1 g	23/06/2025 - 23/06/2025	0,00 €	35,00
Demolizione di pavimenti e rivestimenti	7 g	24/06/2025 - 30/06/2025	0,00 €	35,00
OPERE STRUTTURALI	22 g			
Cassature in legno	3 g	01/07/2025 - 03/07/2025	0,00 €	35,00
Ferro in opera	5 g	04/07/2025 - 08/07/2025	0,00 €	35,00
Platea di fondazione	3 g	09/07/2025 - 11/07/2025	0,00 €	35,00
Getto di calcestruzzo mediante autobetoniera	2 g	14/07/2025 - 15/07/2025	0,00 €	35,00
Vibrazione calcestruzzo	2 g	14/07/2025 - 15/07/2025	0,00 €	35,00
Disarmo strutture c.a.	2 g	21/07/2025 - 22/07/2025	0,00 €	35,00
Installazione struttura aerogeneratore	2 g	14/07/2025 - 15/07/2025	0,00 €	35,00
CONSOLIDAMENTI EDIFICI IN C.A.	28 g			
Puntellature	5 g	18/07/2025 - 22/07/2025	0,00 €	35,00
Spicconatura calcestruzzo degradato	10 g	23/07/2025 - 01/08/2025	0,00 €	35,00
Pulizia e trattamento delle armature	3 g	04/08/2025 - 06/08/2025	0,00 €	35,00
Ripristino copriferro	2 g	07/08/2025 - 08/08/2025	0,00 €	35,00
Consolidamento di strutture con fibre di carbonio	4 g	11/08/2025 - 14/08/2025	0,00 €	35,00

[illegible]

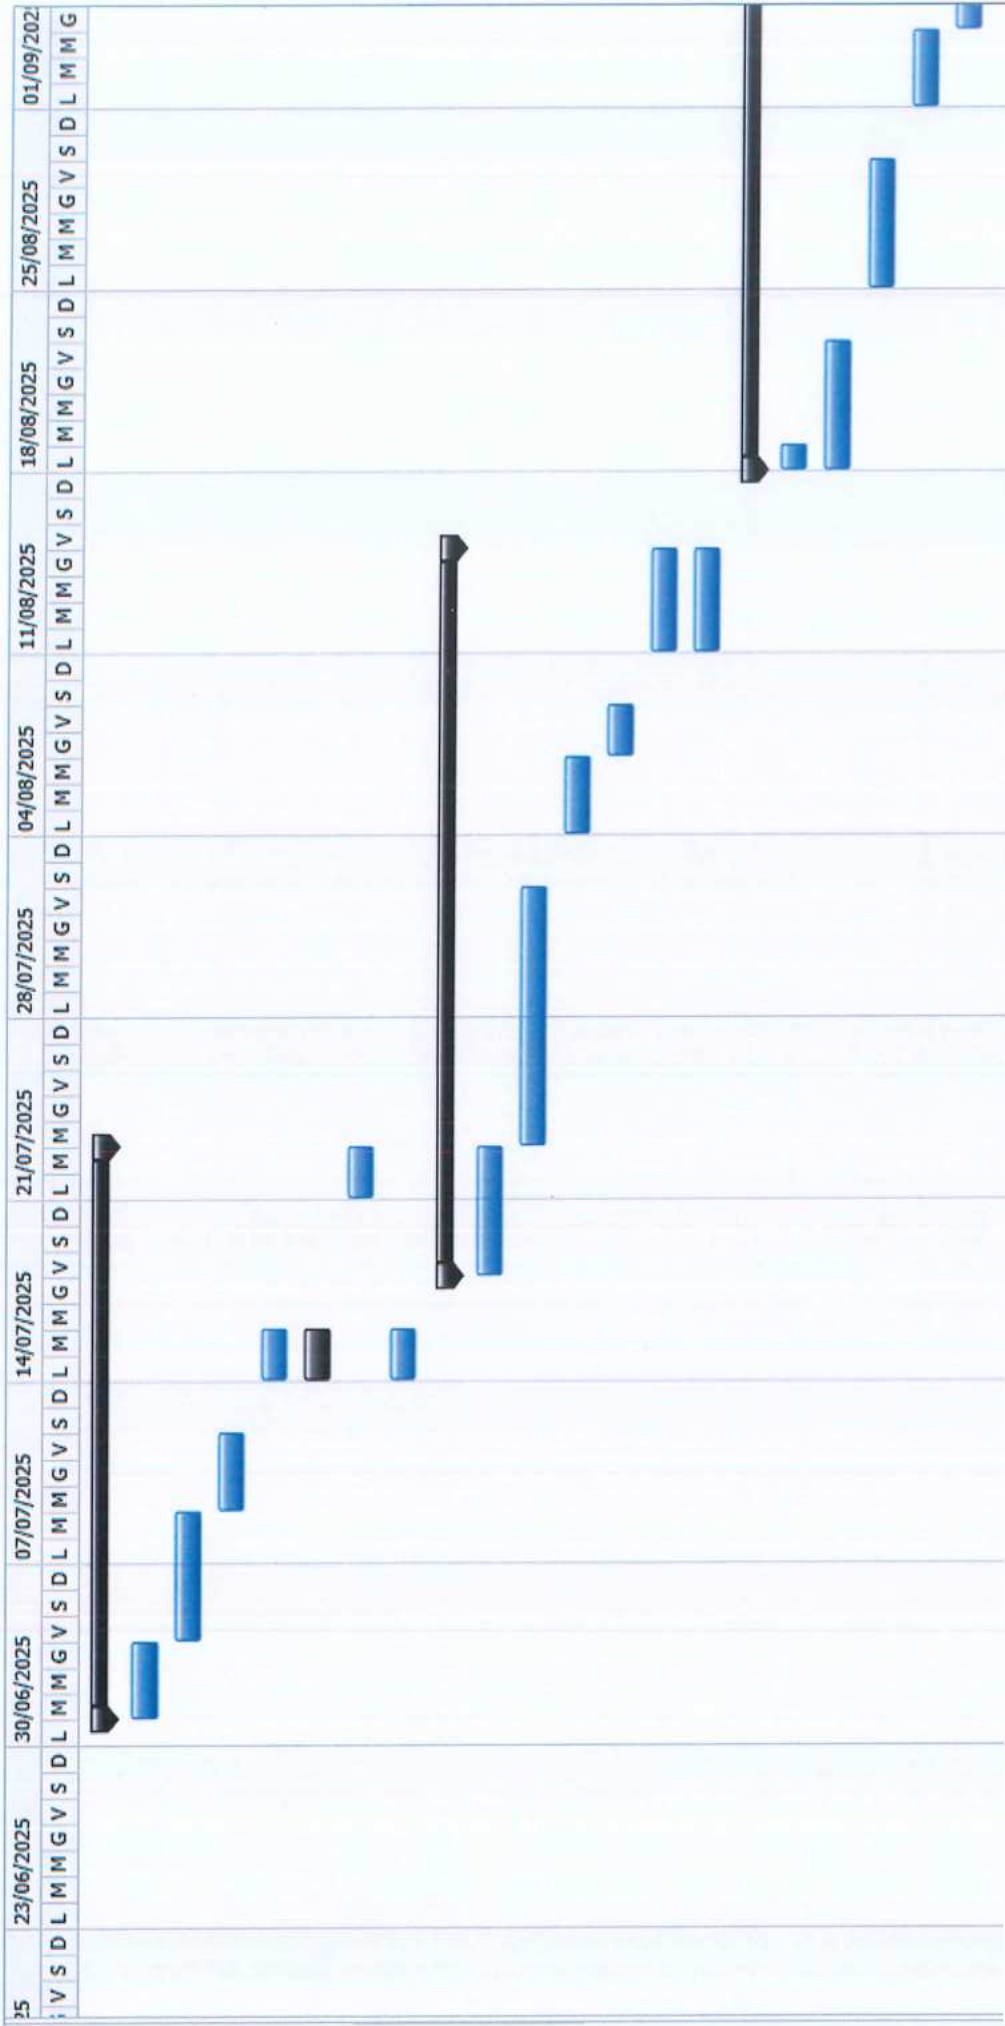

[illegible]

[illegible]
